



**H. AYUNTAMIENTO 2024-2027**

**CDFDZ**

**UN GOBIERNO DE ESPERANZA**

INFORME MENSUAL  
DICIEMBRE 2024

---

OBRAS PÚBLICAS

## 🏠 2 de Diciembre - Acarreo de Material y Arreglo de Camino en Atotonilco

📍 Atotonilco 👥 625 Beneficiarios

El director de Obras Publicas el C. Everardo Medina Loera dando muestra de su compromiso con la Ciudadanía y sin importar la falta de personal capacitado para el manejo de la Maquinaria, realizó trabajos de Acarreo de Material con con un tota de 15 camiones para Camino Atotonilco hacia la Tiza arreglo de Cruce de Arroyo de la Localidad, dando ejemplo de su compromiso con la población.



## 🏠 2 de Diciembre - Conformación de Campo Ojo de agua de Solano

📍 Ojo de Agua de Solano

Se realizó la conformación del Campo en la Localidad de Ojo de Agua de Solano de la Localidad de Cd. Fernández





### **🗓️ 3 de Diciembre - Inicio de trabajos en calle General Lázaro Cárdenas en la Comunidad de Atotonilco**

 Atotonilco

Se da inicio a los trabajos de carga, acarreo, extendido y relleno de zanjas para arreglar la calle de General Lazaro Cárdenas de la Localidad de Atotonilco









## 🏗️ 4 de Diciembre - Apoyo a la Capilla de la Santa Cruz en la Localidad de la Cruz del Mezquite

📍 Cruz del Mezquite

Se apoyo con la demolicion de piso y firme asi como tambien el retiro de materiales de la Capilla de la Santa Cruz Ubicada en la localidad de la Cruz del Mezquite de esta cabecera municipal.



## 🏗️ 4 de Diciembre - Rehabilitación calle General Lázaro Cárdenas en la Comunidad de Atotonilco

📍 Atotonilco

Se continuan con los trabajos de carga, acarreo de material de banco, relleno y extendido de material para la Rehabilitacion en la calle General Lazaro Cardenas en la comunidad de



## 6 | INFORME DICIEMBRE 2024 Obras Públicas.

Atotonilco. Cabe hacer mención que en estas acciones participaron con gran entusiasmo los beneficiarios de la Comunidad en especial las mujeres quienes dieron una muestra de que trabajar de la mano Gobierno-Ciudadano se logran las metas!









## 5 de Diciembre - Extendido y nivelado en calle Lázaro Cárdenas de la Comunidad de Atotonilco

Atotonilco

Se realizó Carga, acarreo de material de banco, con camion y bobcat, incluyendo extendido y nivelado con camion Bobcat en calle General Lazaro Cardenas en la comunidad de Atotonilco







### 📅 6 de Diciembre - Conferencia Equidad y No Discriminación

📍 Ciudad Fernández

Se asistió a la Conferencia Equidad y No Discriminación impartida por el H. Ayuntamiento de Cd. Fernández y la Coordinación de Derechos Humanos



### 📅 6 de Diciembre - Continuación con trabajos en la Capilla de la Santa Cruz

📍 Cruz del Mezquite

Se continúa con la demolición del piso y firme en Capilla de la Santa Cruz en la Localidad de la Cruz del Mezquite, Cd. Fernández.





## 🗓️ 7 de Diciembre - Participación Caravana Navideña 2024

📍 Ciudad Fernández

El departamento de obras Publicas participo con gran entusiasmo en la Caravana Navidena 2024 del H. Ayuntamiento de Cd. Fernández la cual se realizo por las principales calles de el Refugio y Cd. Fernandez.







## 🗓 9 de Diciembre - Conformación Camino Canal Lateral Media Luna

📍 Los Llanitos

Conformación de 770 metros lineales en el camino canal Lateral Media Luna (tramo comprendido del Panteón a Calle Ricardo Flores Magon) en la Localidad los Llanitos, Cd. Fernandez.



## 🗓 10 de Diciembre - Colocación muros en el Departamento de Oficialía Mayor

📍 Ciudad Fernández

Se trabajo en el Departamento de Oficialia Mayor con la colocación de Muros Divisorios de Tablaroca esto con el fin de apoyar al departamento con su nueva organización para brindar



una mayor y atención al público en general.



### **🗓 11 de Diciembre - Abundado, Carga, acarreo y extendido de Material, en el camino al Zancudo**

 El Refugio

Se realizaron trabajos de Abundado, carga, acarreo extendido de Material de banco de arreglo de bache sobre la Calle Porfirio Diaz camino el Zancudo en la Localidad de el Refugio, Cd. Fernandez.







### 🗓️ 11 de Diciembre - Secciones transversales camino canal Valentin Gama

📍 Ciudad Fernández

Se realizaron secciones transversales cada 20 metros en camino a canal de Valentín Gama a donde termina el Centro de Salud con una longitud de 260 metros lineales

### 🗓️ 12 de Diciembre - Carga y retiro de escombros en la Capilla de la Santa Cruz

📍 Cruz del Mezquite

Se continúan con los trabajos en la Capilla de la Santa Cruz con la carga y retiro de escombros en la Localidad de la Cruz del Mezquite Cd. Fernández, S.L.P.



### 🗓️ 13 de Diciembre - Planta de Cruce de Calle Av. E. Zapata y Zaragoza en el Refugio

📍 El Refugio

Se realizó Planta de Cruce de Calle AV. E. Zapata y Zaragoza en el Refugio Cd. Fernández para



ubicar bache



## 🏠 16 de Diciembre - Abundamiento de material para el Relleno Sanitario

📍 Puestecitos

Se realizo abundamiento de material de banco para la cobertura de capa de basura en el Relleno Sanitario Municipal de Cd. Fernández con maquinaria Bulldozer D-5



## 🏠 16 de Diciembre - Trazo sobre centro de Rio en la Localidad de San Isidro

📍 San Isidro

Se realizo trazo sobre centro del Rio en la Localidad de San Isidro





## 🏠 17 de Diciembre - Rehabilitación de piso Capilla de la Santa Cruz

📍 Cruz del Mezquite

Se continua con el apoyo a la Capilla de la Santa Cruz, en la Localidad de la Cruz del Mezquite. Realizando la Rehabilitación de piso.



## 🏠 17 de Diciembre - Conformación Calle el Huizache, en Prados de Fertimex

📍 Los Llanitos

Se realizó la conformación de la Calle el Huizache en Prados de Fertimex en la Localidad de los Llanitos Cd. Fernández.



## 🏠 17 de Diciembre - Conformación de la Calle Joaquín González en Prados de Fertimex

📍 Los Llanitos

Se realizó la Conformación de la Calle Joaquín González en Prados de Fertimex en la Localidad



de los Llanitos Cd. Fernández.



## 📅 17 de Diciembre - Continuación de trabajos en la Calle Miguel Hidalgo en los Llanitos.

📍 Los Llanitos

Se continúa con el abundado, carga, acarrero y extendido de material de banco en Calle Miguel Hidalgo de la Calle Colón a Canal Media Luna en la Localidad de los Llanitos Cd. Fernández



## 📅 17 de Diciembre - Nivelación y Bandeado en el Relleno Sanitario




 Puestecitos

Se realizaron los trabajos de Nivelación y bandeo de basura para preparar espacios a los camiones recolectores para su depósito en la Celda 1, utilizando maquinaria Bulldozer D-7

 **17 de Diciembre - Perfil y secciones transversales sobre Rio en la Localidad de San Isidro** San Isidro

Se realizo Perfil y secciones transversales cada 20 metros sobre el rio de lado a lado en la localidad de San Isidro Cd. Fernandez

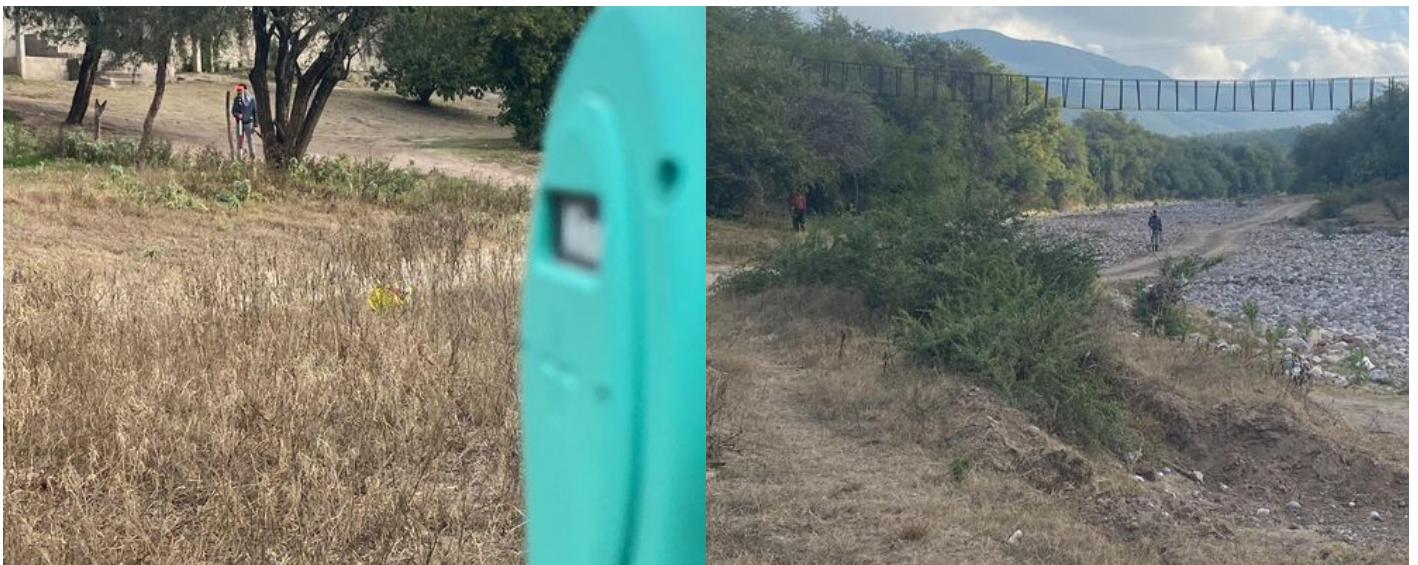





## 📅 18 de Diciembre - Conformación de la Calle Joaquín González Barrio Primero

📍 El Refugio

Se realizó la Conformación de la Calle Joaquin González en el Barrio primero en el Refugio Cd. Fernández



## 📅 18 de Diciembre - Carga y acarreo de material para el Relleno Sanitario

📍 Puestecitos

Este día se trabajó con el acarreo y carga de material de banco para la cobertura en el Relleno Sanitario esto es con prioridad ya que en esta época decembrina se duplica la cantidad de desechos





### 📅 18 de Diciembre - Planta de Rio y Camino en la Localidad de San Isidro

📍 San Isidro

Se realizó Planta de Rio y camino a un costado en donde se ubica puente colgante en la Localidad de San Isidro Cd. Fernández



### 📅 19 de Diciembre - Contingencia en el Relleno Sanitario por lluvia

📍 Puestecitos

Este día por la lluvia las rampas de acceso que se encuentran en la celda del Relleno Sanitario estan resbalosas por tal motivo los camiones recolectores no pueden subir a depositar dichos desechos por lo que se determinó tirarlos abajo y posteriormente subirlos a su celda.



## 19 de Diciembre - Trazo y Perfil sobre el centro del Rio en la Localidad de San Isidro

San Isidro

Se realiza trazo y perfil de 100 metros mas sobre el centro en Rio de la localidad de San Isidro Cd. Fernández



## 20 de Diciembre - Secciones transversales en rio y camino en la Localidad de San Isidro

San Isidro

Se realizaron secciones transversales cada 20 metros y planta en rio y camino en San Isidro en Cd. Fernández





## 🏗️ 23 de Diciembre - Planta, perfil y secciones transversales en Priv. Gómez Farías Cd. Fernández

📍 Ciudad Fernández

Se realizó Planta, perfil y secciones transversales cada 10 metros en Priv. de Gómez Farías en Cd. Fernández



## 🏗️ 24 de Diciembre - Trazo y Perfil Calle Miguel Hidalgo

📍 El Saucillo

Se realiza trazo y perfil de calle Miguel Hidalgo en la localidad del Saucillo de camino principal a insurgentes longitud 535 m.



## 🏗️ 26 de Diciembre - Supervisión de trabajos de Conformación y revestimiento



 El Refugio

Se realizó una supervisión a los trabajos de Conformación y Revestimiento en la Calle Madero del Boulevard el Refugio a Calle Porfirio Diaz en el Refugio Cd. Fernández realizando 917 metros lineales.



### 26 de Diciembre - Supervisión de Trabajos de Conformación y revestimiento

 El Refugio

Se realizó supervisión de trabajos de Conformación y Revestimiento a Calle que da acceso lateral al Refugio de Baoulevard el Refugio a final de calle realizando 227 metros lineales





## 📅 26 de Diciembre - Trazo, perfil y secciones en calle el Ojito

📍 Ciudad Fernández

Trazo, perfil y secciones cada 10 metros y planta en calle del ojito de donde termina pavimento a calle martinez con una longitud de 120 metros





## 📅 27 de Diciembre - Se continua trabajos en el Relleno Sanitario

📍 Puestecitos

Se continuo trabajando con el amontonamiento de basura para su carga y acarreo del exterior del Relleno Sanitaria su confinamiento final con un total de 200 m<sup>3</sup>







## 🗓️ 27 de Diciembre - Limpieza Calle Morelos esq. con Cuauhtémoc

📍 Ciudad Fernández

Se realizó limpieza y retiro de de escombros en la Calle Morelos esq. con Cuauhtemoc con esta acción se da acceso total a una de las principales calles en la Cabecera Municipal



## 🗓️ 27 de Diciembre - Revestimiento y Conformación Calle Francisco I. Madero

📍 El Refugio

Se realizó el restimiento y conformación a Calle Francisco I. Madero de Boulevard ciudad Fernández a Calle Jimenez esto en el Refugio Cd. Fernández





## 📅 27 de Diciembre - Carga y acarreo de material para la Calle Francisco I. Madero

📍 El Refugio

Se realizó carga y acarreo de material de banco para el Revestimiento en la calle Francisco I. Madero del Refugio Cd. Fernández





## 🏗️ 27 de Diciembre - Conformación de calle Guadalupe Martínez

📍 Ciudad Fernández

Se realizó la conformación de la Calle Guadalupe Martínez de Moctezuma a Benjamín Robles en la cabecera Municipal de Cd. Fernández



## 🏗️ 27 de Diciembre - Conformación de la Calle SARH en Cabecera Municipal

📍 Ciudad Fernández

Se realizó la conformación de la Calle SARH de Calle Emiliano Zapata a Col. Casa Blanca en la cabecera Municipal de Cd. fernández





## 27 de Diciembre - Conformación Calle Casa Blanca en Cabecera Municipal

Ciudad Fernández

Se realizó la conformación de la Calle Casa Blanca en la Colonia Casa Blanca en esta Cabecera Municipal



## 27 de Diciembre - Trazo, perfil y secciones Calle Martínez

Ciudad Fernández

Trazo, perfil y secciones cada 20 metros en calle Martínez de calle Arista hasta el Rioverde con una Longitud de 320 m





## 🗑️ 28 de Diciembre - Trabajos coordinados en el Relleno Sanitario para el confinamiento de los desechos.

 Puestecitos

Se realizó trabajos coordinados para amontonar, cargar y acarrear basura desde el exterior para su confinamiento en la celda 1 ya que con las pasadas lluvias se depositó momentáneamente abajo del relleno ya que los camiones recolectores no podían subir pues el acceso estaba resbaloso se logró acarrear 420 m<sup>3</sup> de basura.







### 🏗️ 30 de Diciembre - Conformación Calle Emiliano Zapata en cabecera Municipal

📍 Ciudad Fernández

Se realizó conformación de la Calle Emiliano Zapata desde la calle Cerritos a Calle SARH en la cabecera Municipal de Cd. Fernández




### 🏗️ 30 de Diciembre - Planta de Calle Martínez

📍 Ciudad Fernández



Se realizó la plata de la calle Martínez de Calle Arista a Rioverde con una longitud de 320 m.

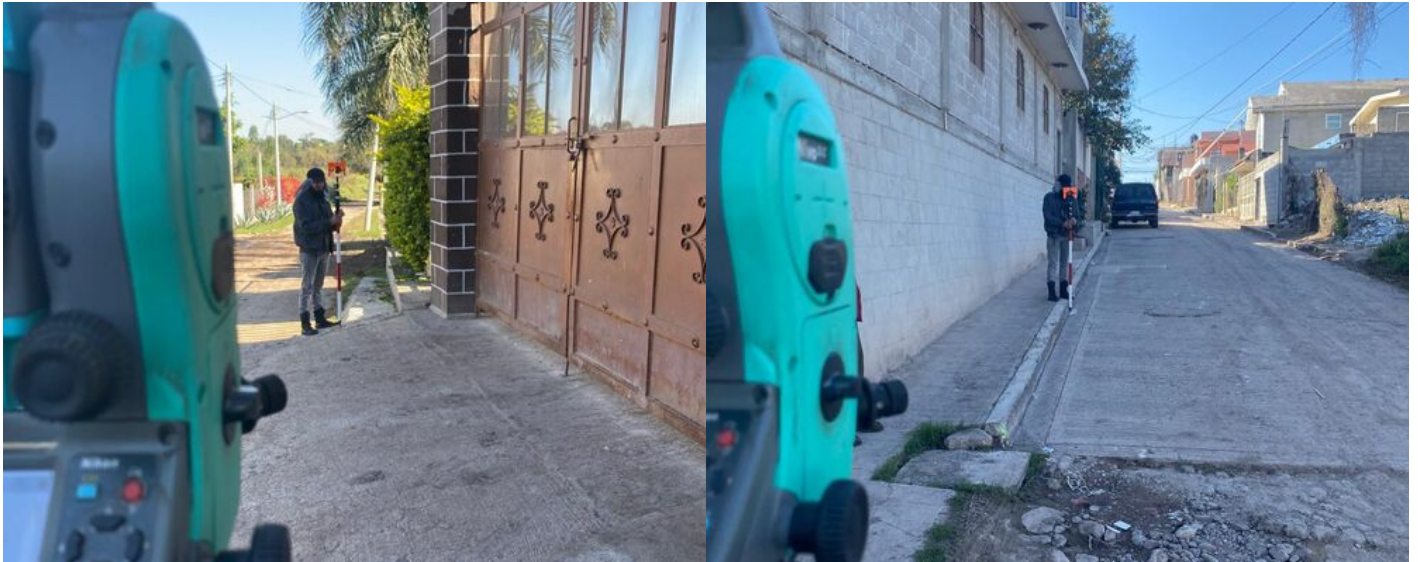

### **31 de Diciembre - Revestimiento y Conformación de la Calle Casa Blanca**

 Ciudad Fernández

Se realizó el revestimiento y la Conformación a la Calle Casa Blanca de la misma Colonia en cabecera municipal



### **31 de Diciembre - Demolición Calle Hidalgo en Cabecera Municipal**

 Ciudad Fernández

Se realizó la demolición de la guarnición en calle Hidalgo area que es destinada para el Tianguis de Cd. Fernández.





### 31 de Diciembre - Planta detallada de el Ojito

Ciudad Fernández

Se realizó planta bien detallada del Ojito Cd. Fernández.





 **Indicadores Mensuales**

#	INDICADOR	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	CONFORMACION DE CALLES	NUMERO DE CALLES MOTOFORMADAS	-



## f Difusión en Facebook

A continuación se muestran las publicaciones realizadas en la Página de Facebook Oficial para la difusión de las diferentes actividades realizadas durante el mes.

12

Publicaciones

514

Me Gusta

103

Compartidas

263

Reproducciones

Alcance Me Gusta Compartir Reproducciones de Video

	<b>2/DIC</b> Inicia la pavimentación de la calle Cuauhtémoczin en CDFDZ	3,081  100  18
	<b>3/DIC</b> Obras Públicas continúa trabajando por Ciudad Fernández	1,107  23  6
	<b>5/DIC</b> Arranca obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Roble en CDFDZ	1,655  38  8
	<b>5/DIC</b> Arranca obra de pavimentación con concreto hidráulico en la calle Roble en CDFDZ	890  17  4  263
	<b>5/DIC</b> Mejorando la infraestructura vial de CDFDZ	1,723  29  8
	<b>10/DIC</b> ¡El Departamento de Obras Públicas sigue trabajando por CDFDZ!	1,659  36  11
	<b>11/DIC</b> TRABAJANDO JUNTOS POR ATOTONILCO	1,374  24  6





**11/DIC**

🚧 ¡Trabajando por un Ciudad Fernández mejor!

2,447 👤 77 👍 12 ➡



**11/DIC**

🚧 ¡Mejorando los caminos para nuestra comunidad!

1,794 👤 40 👍 5 ➡



**13/DIC**

🚧 Mejorando los caminos de Ciudad Fernández 🌟

1,675 👤 37 👍 8 ➡



**17/DIC**

🚧 Trabajos continuos en el Relleno Sanitario Intermunicipal 🚧

1,378 👤 14 👍 4 ➡



**27/DIC**

🚧 Continuamos mejorando la infraestructura vial en Ciudad Fernández 🚧

6,408 👤 79 👍 13 ➡
